

## EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Oznaczenie arkusza: E.13-04-20.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: E.13

Numer zadania: **04** Wersja arkusza: **SG** 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

### Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka – –	N	ume	r PES	SEL	zda	ijące	ego*		ume lowis	
Kod egzaminatora										
Data egzaminu Dzień Miesiąc Rok										
Godzina rozpoczęcia egzaminu :										

<sup>\*</sup> w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

# Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

	Śa
5	<u>.</u> [S
3	Š
2	ĭ
7	ita

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

### Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

#### Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń

Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ÷ 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 ÷ 1.8 ocenić po zakończeniu egzaminu.

Przewody podłączone do styków modułu Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm

Gniazdo jest zmontowane poprawnie, moduł Keystone jest zamocowany w gnieździe

Wszystkie żyły kabla podłączone są do styków modułu Keystone wg sekwencji T568A

Przewody podłączone do panelu krosowniczego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm

Wszystkie żyły kabla podłączone są do panelu krosowniczego wg sekwencji T568A

Przeprowadzony test wykonanego połączenia za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający)

Do portu 1 przełącznika1 jest podłączony ruter, do portu 2 jest podłączony przełacznik2, do portów 3 i 4 dwie karty sieciowe serwera

Do portu 1 przełącznika2 jest podłączony przełacznik1, do portu 2 jest podłączona stacja robocza

	Numer stanowiska		
Rezultat 2: Skonfigurowane urządzenia sieciowe Uwaga! Hasło konta Administrator serwera to Q@wertyuiop Hasło konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop Hasło do przełącznika przekaże asystent techniczny. Jeżeli przełączniki wymagały zmiany hasła, to hasło powinno zostać ustawione na zaq1@WSX			
1 Ruter ma ustawiony adres WAN: IP 17.17.0.2, maska sieci 255.255.0.0, brama domyślna 17.17.0.1, DNS 8.8.8.8			
2 Ruter ma ustawiony adres LAN: IP 172.20.0.1, maska 255.255.254			
3 Ruter ma wyłączony serwer DHCP i sieć WiFi			
4 Przełącznik 1, do którego podłączony jest serwer i ruter, ma ustawiony adres IP 192.168.20.1 z maską 255.255.255.128			
Przełącznik 1 ma utworzone dwie sieci VLAN: nazwa VLAN2 z ID=2 nazwa VLAN3 z ID=3			
6 W przełączniku 1 do VLAN2 przypisane są porty 1 i 3 bez znakowania (w trybie dostępu)			
7 W przełączniku 1 do VLAN3 przypisane są porty 2 i 4 bez znakowania, pozostałe porty są przypisane do VLAN-u domyślnego			
8 Przełącznik 2, do którego podłączona jest stacja robocza, ma ustawiony adres IP 192.168.20.2 z maską 255.255.255.128			
9 Przełącznik 2 ma utworzony VLAN o nazwie VLAN3 z ID=3, z przypisanymi portami 1 i 2 bez znakowania (w trybie dostępu)			

r ska			
Numer stanowiska			
] sta			

Rezultat 3: Skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

Uwaga! W przypadku innych niż podane nazwy interfejsów sieciowych serwera (LAN1 i LAN2) należy oceniać rezultaty konfiguracji odpowiednio pierwszego i drugiego interfejsu sieciowego serwera.

Po informacji od przewodniczącego ZN o skonfigurowaniu interfejsów sieciowych należy ocenić komunikację pomiędzy urządzeniami sieciowymi (kryteria: 3.6 ÷ 3.8). Sprawdzenia komunikacji wykonuje zdający w obecności egzaminatora.


1	Na serwerze interfejs sieciowy podłączony do 3 portu przełącznika 1 ma ustawioną nazwę LAN1, drugi interfejs sieciowy podłączony do 4 portu przełącznika 1 ma ustawioną nazwę LAN2			
2	Na serwerze połączenie sieciowe LAN1 (interfejs podłączony do portu 3 przełącznika 1) ma ustawiony adres IP 172.20.0.2 z maską 255.255.254, adres bramy 172.20.0.1, adres serwera DNS 127.0.0.1			
3	Na serwerze połączenie sieciowe LAN2 (interfejs podłączony do portu 4 przełącznika 1) ma ustawiony adres IP 192.168.20.10 z maską 255.255.255.128, adres bramy nieprzydzielony, adres serwera DNS 127.0.0.1			
4	Na stacji roboczej połączenie sieciowe ma ustawiona nazwę LAN2			
5	Na stacji roboczej połączenie sieciowe LAN2 ma przydzielany automatycznie adres IP i adres serwera DNS			
6	Wykonane na serwerze polecenie ping 172.20.0.1 potwierdza komunikację z ruterem			
7	Wykonane na serwerze polecenie ping 192.168.20.1 potwierdza komunikację z przełącznikiem 1			
8	Wykonane na serwerze polecenie ping 192.168.20.2 potwierdza komunikację z przełącznikiem 2			

r ska			
Numer stanowiska			
N stan			

	$^{\infty}$						
Uv	zultat 4: Skonfigurowane usługi sieciowe serwera vaga! Po informacji od przewodniczącego ZN należy ocenić wyświetlanie stron w przeglądarce (kryteria: 4.8 ÷ 4.10). Wyświetlanie wykonuj zaminatora.	je z	daje	ący 1	w ob	ecnos	ici
1	Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DHCP						
2	W serwerze DHCP jest utworzony zakres o nazwie <i>LAN2</i> i przypisane są adresy od 192.168.20.11 do 192.168.20.50						
3	W ustawieniach serwera DHCP skonfigurowano czas dzierżawy adresu na 2 dni, nazwę domeny nadrzędnej <i>egzamin.local</i> , adres DNS 192.168.20.10						
4	W serwerze DHCP jest utworzone zastrzeżenie adresu 192.168.20.20 dla interfejsu sieciowego stacji roboczej						
5	Na serwerze jest zainstalowana, skonfigurowana i uruchomiona usługa rutingu						
6	Na serwerze jest zainstalowany serwer DNS						
7	w serwerze DNS jest utworzona strefa wyszukiwania do przodu sprzet.local						
8	W strefie wyszukiwania do przodu <i>sprzet.local</i> jest utworzony rekord typu A wiążący nazwę domenową <i>ruter.sprzet.local</i> z adresem IP 172.20.0.1						
9	Na stacji roboczej po wpisaniu w przeglądarce http://ruter.sprzet.local wyświetla się strona konfiguracji rutera						

	$_{ m N}^{ m N}$ ano						
	stan stan						
Przebieg 1: Wykonanie okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń							
Zdo	njący:						
1	przy wykonywaniu połączenia gniazdo-panel krosowniczy, zdejmował izolację z kabla UTP stosując narzędzia do tego celu przeznaczone						
2	przy montażu kabla UTP w module Keystone gniazda sieciowego stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem						
3	przy montażu kabla UTP w panelu krosowniczym stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	po wykonaniu kabla połączeniowego uporządkował stanowisko egzaminacyjne						

Egzaminator	
imie i nazwisko	data i czytelny podnis

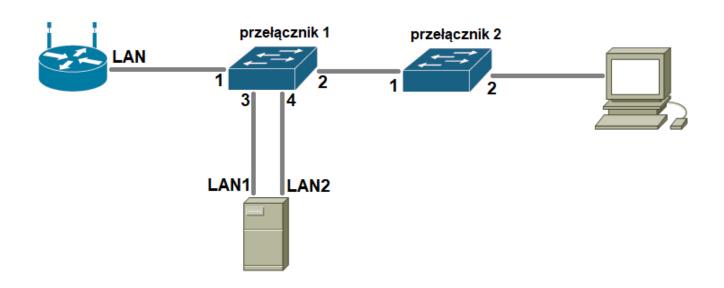

Schemat połączenia urządzeń sieciowych
